


WELCOME LEADERS AND INNOVATORS

WE MANAGE KNOWLEDGE


DR. VANESSA SALM

LIVING DIGITAL KNOWLEDGE MANAGEMENT

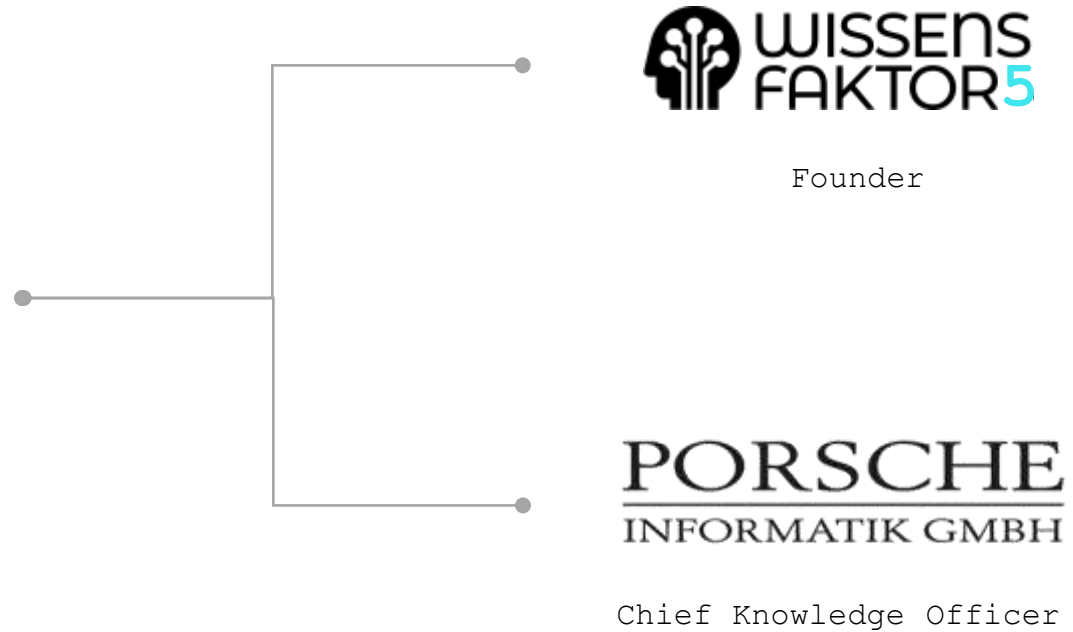

Mag. (FH) Betriebswirtschaft- Fachhochschule Urstein
PhD Management - Universität Innsbruck
booking.com | ncm.at | hotelkit | Skidata

NEUE METHODE ZUR DIGITALEN KM TRANSFORMATION

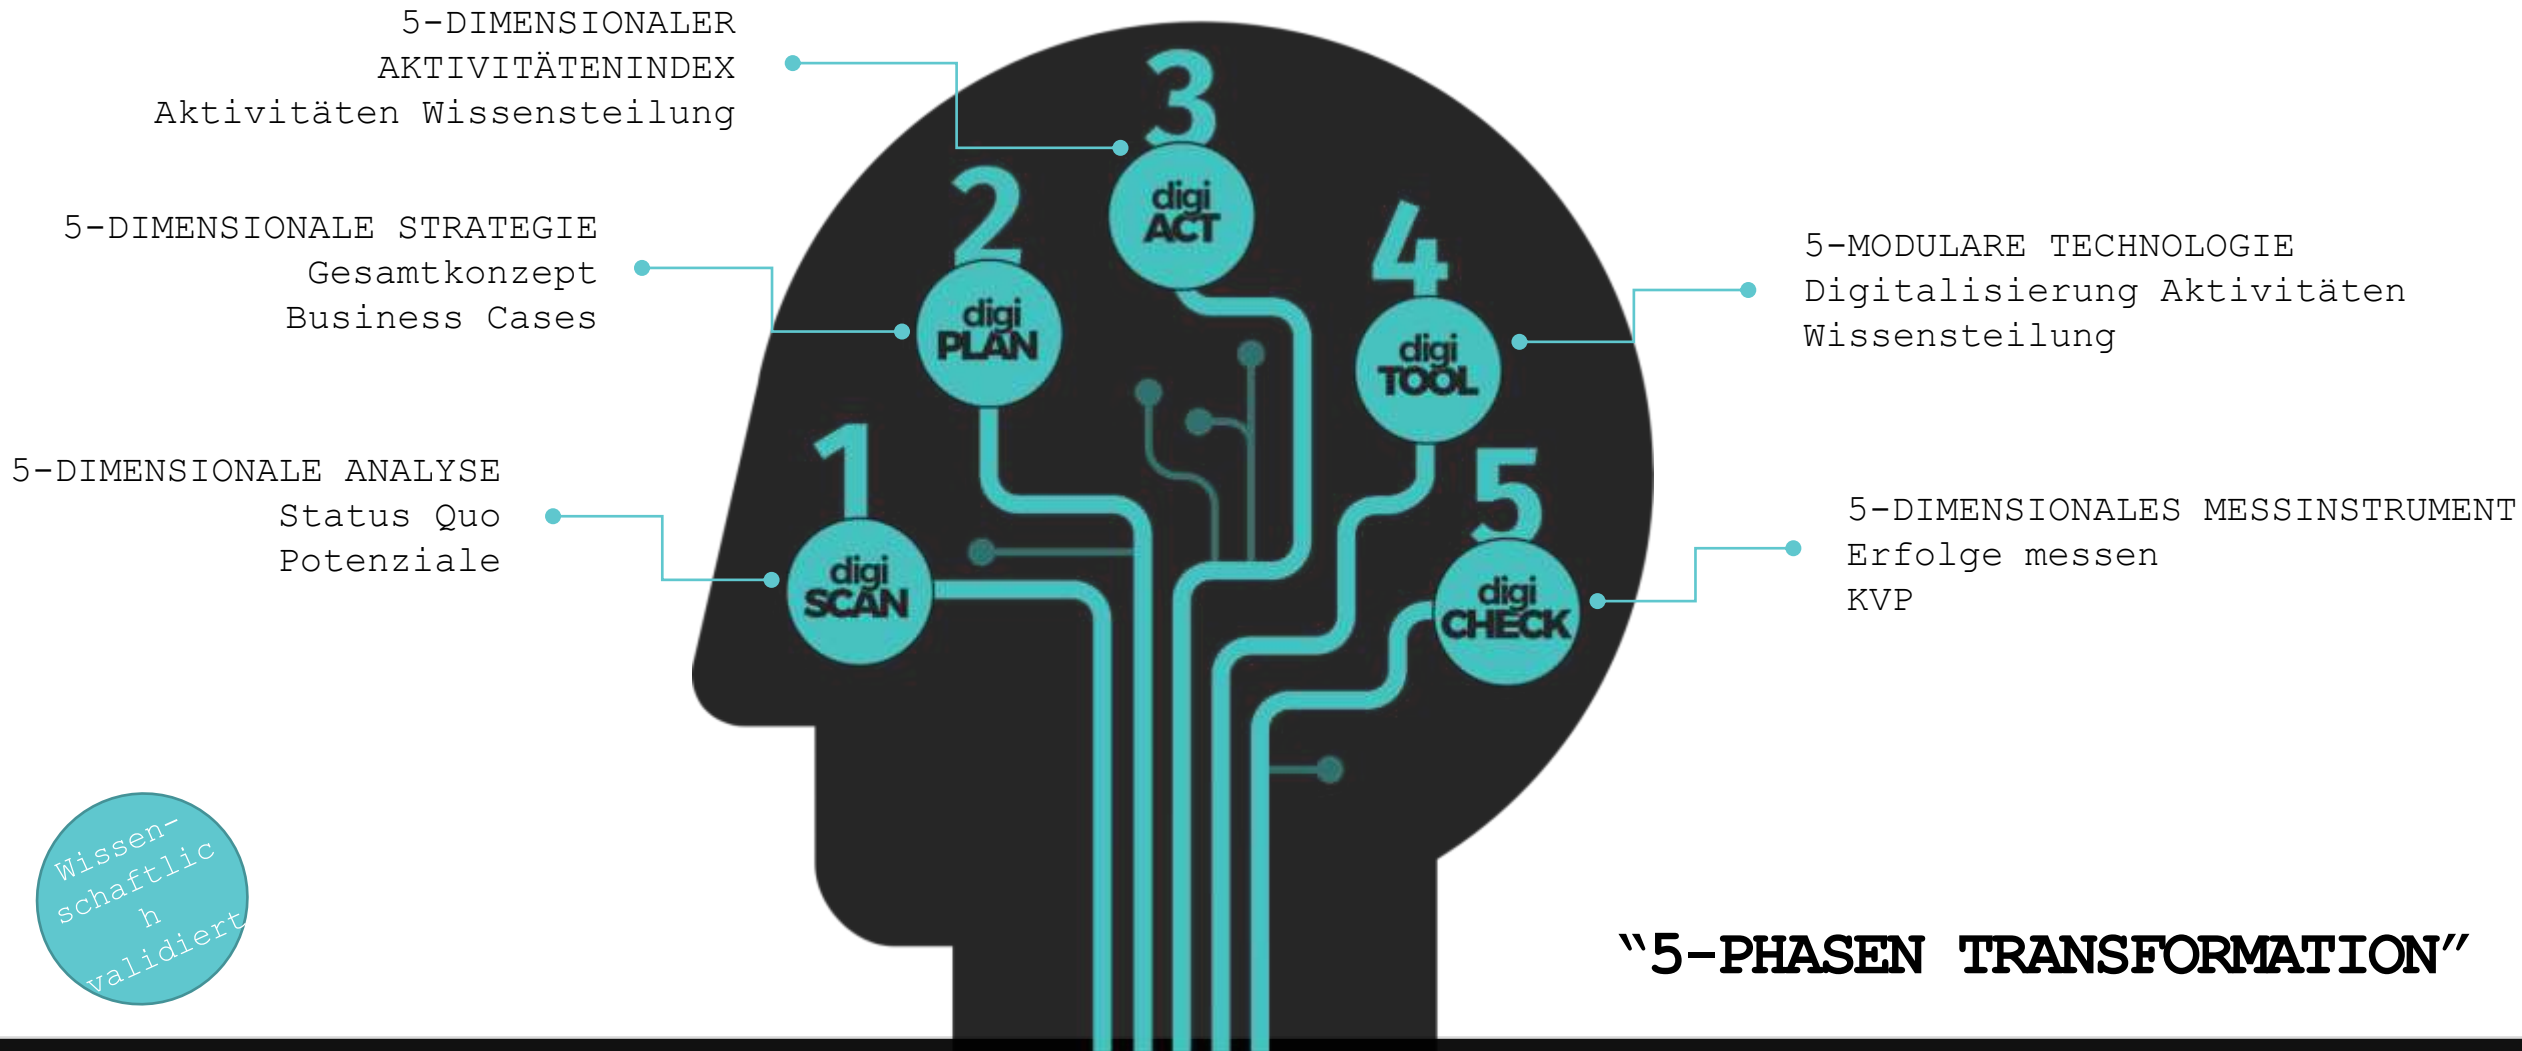

ABLAUF ENTWICKLUNG KONZEPT "FROM KM TO PM"

DESIGN BASIS FRAMEWORK FÜR EIN
KONZEPT FÜR DIGITALES
WISSENSMANAGEMENT IM
PROJEKTMANAGEMENT
pma quarterly 09/21

VORSTELLUNG WORKSHOP ERGEBNISSE


FRAGERUNDE

DIGITALISIERUNG WISSENSMANAGEMENT IM
PROJEKTMANAGEMENT

Digitale Umsetzung des Konzeptes für Porsche
Informatik

LIVE DEMO KNOWLEDGEWORLD

FRAGERUNDE



DESIGN THEORETISCHES KONZEPT
WISSENSMANAGEMENT IM PROJEKTMANAGEMENT

Weiterentwicklung des Konzeptes für Porsche
Informatik
5-Phasen Transformation lt. Wissensfaktor5

VORSTELLUNG KONZEPT „FROM KM TO PM“

FRAGERUNDE

AUSTAUSCH
Fragen & Antworten



PART 1

VORSTELLUNG

WORKSHOP ERGEBNISSE


PMA WORKSHOP 09/21

- FRAGE 1: Was ist kritisches Wissen im Projektmanagement?
- FRAGE 2: Zu welchen **Zeitpunkt** muss das Wissen externalisiert werden?
- FRAGE 3: Anhand welcher Methoden kann man dieses Wissen externalisieren?
- FRAGE 4: Anhand welcher Strukturen kann man dieses Wissen sichern?
- FRAGE 5: Zu welchem Zeitpunkt muss dieses Wissen zum Projektteam transferiert werden, damit es einen Mehrwert hat?

KRITISCHES WISSEN

ALLGEMEINES PM WISSEN


PROJEKTMANAGEMENT STANDARDS
Prozesse & Methoden



GUIDELINES
PM
Richtlinien


PROJEKTSPEZIFISCHES PM WISSEN

PROJEKTWISSEN
Kategorie, Art




BEST PRACTICES
Erfolgsfaktoren,
Tipps, How-Tos

LESSONS LEARNED
Risiken und
Maßnahmen




KUND*INNENWISSEN
LIEFERANT*INNENWISSEN
Spezifika,
Bewertungen

INFORMELLES WISSEN
Kultur, Netzwerk, Key
Player



METHODEN ZUR EXTERNALISIERUNG

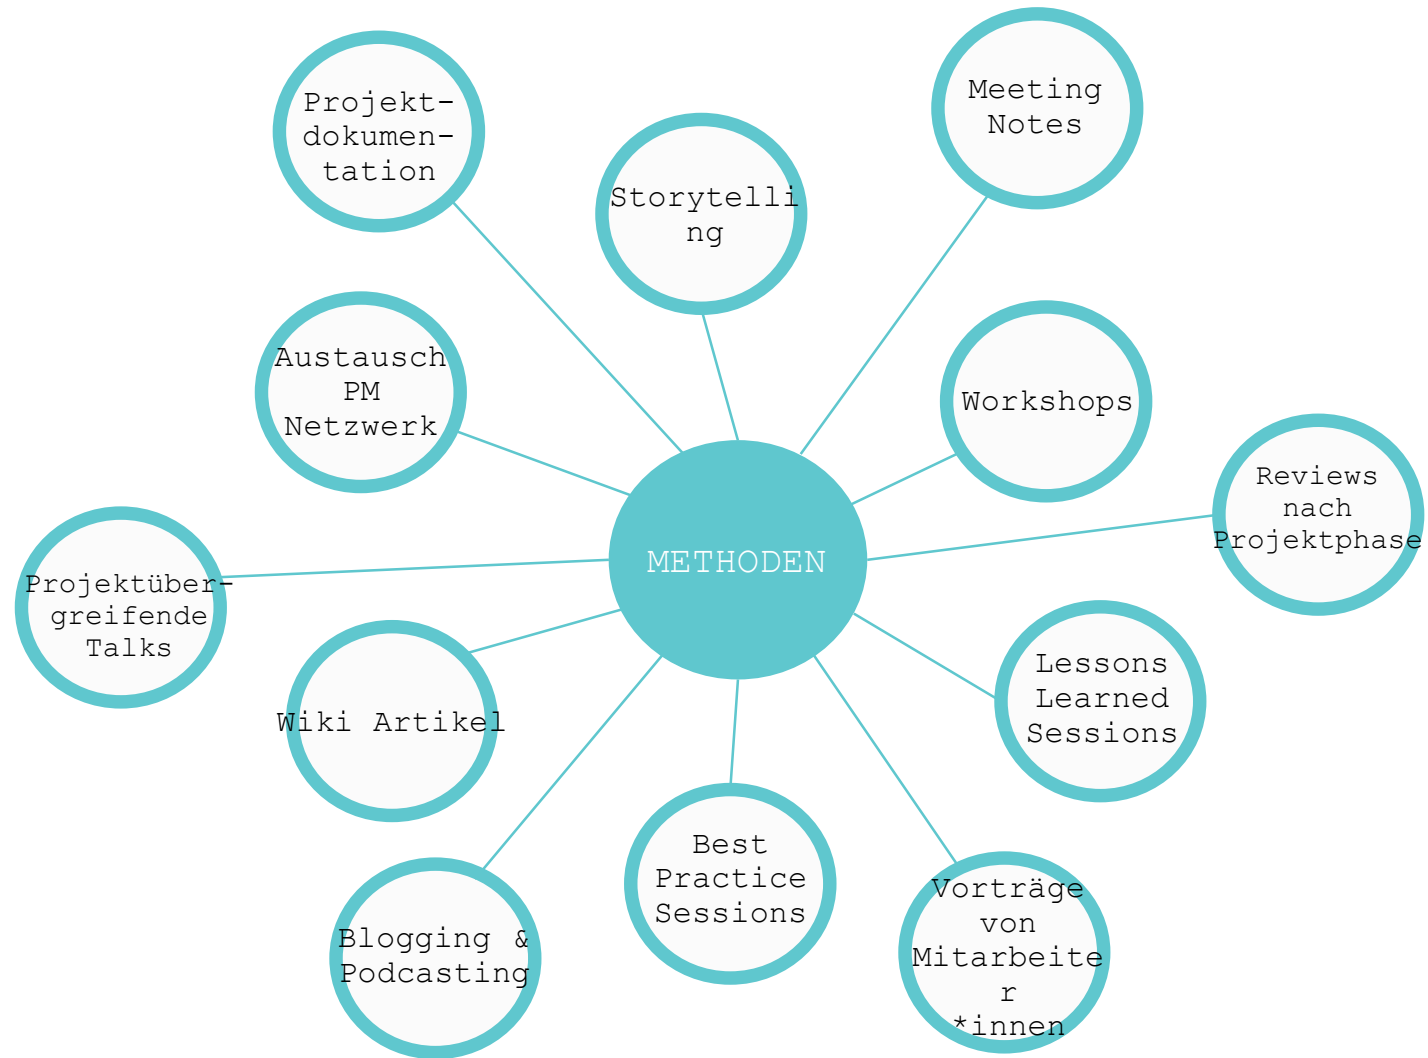

ZEITPUNKT DER EXTERNALISIERUNG



MÖGLICHKEITEN ZUR STRUKTURIERUNG

META DATEN

Projekttyp (Analyse Projekt,
Entwicklungsprojekt, etc.)

Projektkategorie (A, B, C, D)

Projektmethode (Agil, Wasserfall)

Projektphasen (Initiierung, Start,
etc.)


Projektverantwortliche (PM, Team)

Auftraggeber*innen

Markt

Internal / External (Geheimhaltung)

ZEITPUNKT FÜR WISSENSTRANSFER

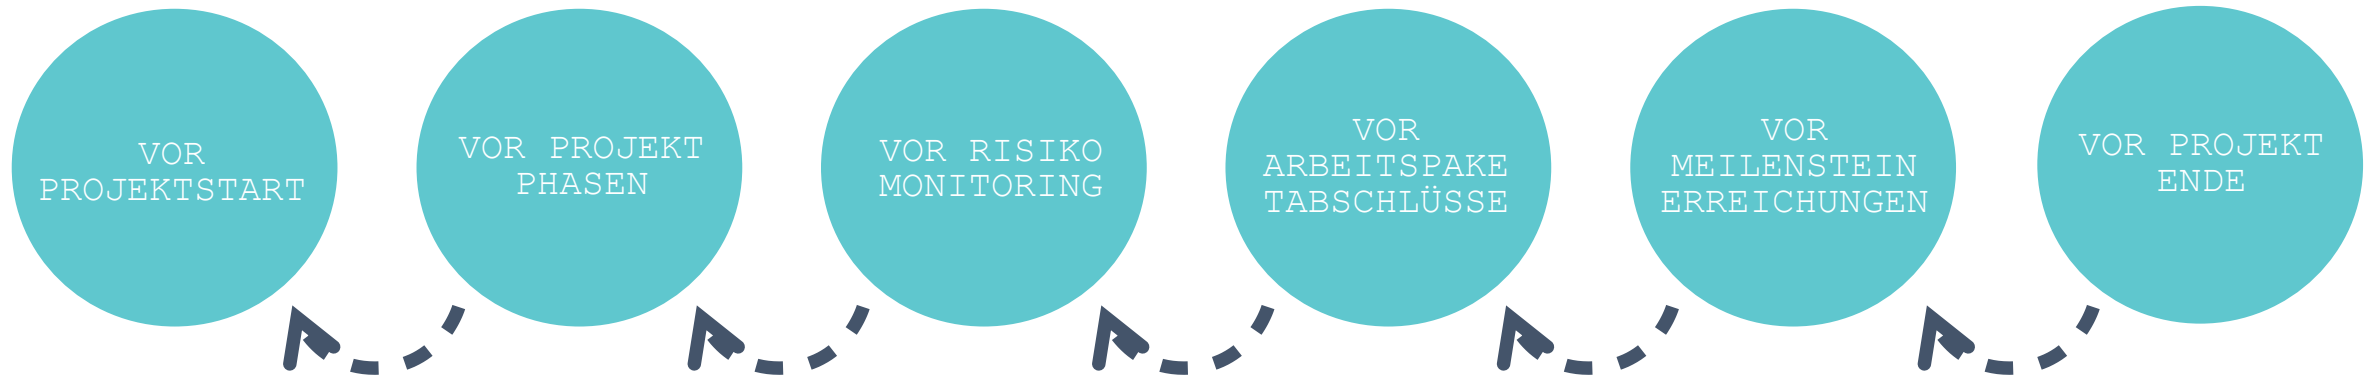

BASIS FRAMEWORK "FROM KM TO PM"

WISSENSART	METHODEN	EXTERNALISIERUNG	STRUKTUR	TRANSFER
Best Practices	Best Practice Sessions	Nach jeder Projektphase	Projekttyp	Vor Projektstart
Lessons Learned	Lessons Learned Sessions	Nach Projektende	Projektkategorie	Vor jeder Projektphase
PM Standards	PM Workshops	Nach dem Risiko Monitoring	Projektmethode	Vor dem Risiko Monitoring
PM Guidelines	Reviews nach Projektphase	Nach Arbeitspaket Abschlüsse	Projektphase	Vor Arbeitspaket Abschlüsse
Projektwissen	Projektübergreifende Talks	Nach Meilenstein Erreichungen	Projektverantwortliche	Vor Meilenstein Erreichungen
Kund*innenwissen	PM Wissensartikel		Auftraggeber*innen	
Lieferant*innenwissen	Austausch PM Netzwerk		Markt	
Informelles Wissen (PSW)	Vorträge von Mitarbeiter*innen		Internal / External	



PART 4
AUSTAUSCH

THANK YOU

WELCOME LEADERS AND INNOVATORS

WE MANAGE KNOWLEDGE



vanessa.salm@porscheinformatik.com



+43 664 3539361
